DYNAMIC CONE PENETRATION TEST RESULTS

Client Name	Life Property Ltd	Date	06/04/2020
Job Name	Nantgaredig	Job No.	2031
		Zero Reading	120
		Test Location	**CBR5**

spectrum geo services

No. of Blows	Reading (mm)	Mean penetration per blow (mm)	Layer	Top of layer (mm)	Base of layer (mm)	Blows at top of layer (no)	Blows at base of layer (no)	Mean penetration per blow (mm)	CBR of layer (%)
0	120								
1	215	95	Layer A	120	500	0	6	63.3	**4**
2	274	59							
3	310	36	Layer B	500	510	6	9	3.3	**85**
4	334	24							
5	350	16							
6	361	11							
7	450	89							
8	500	50							
9	510	10							

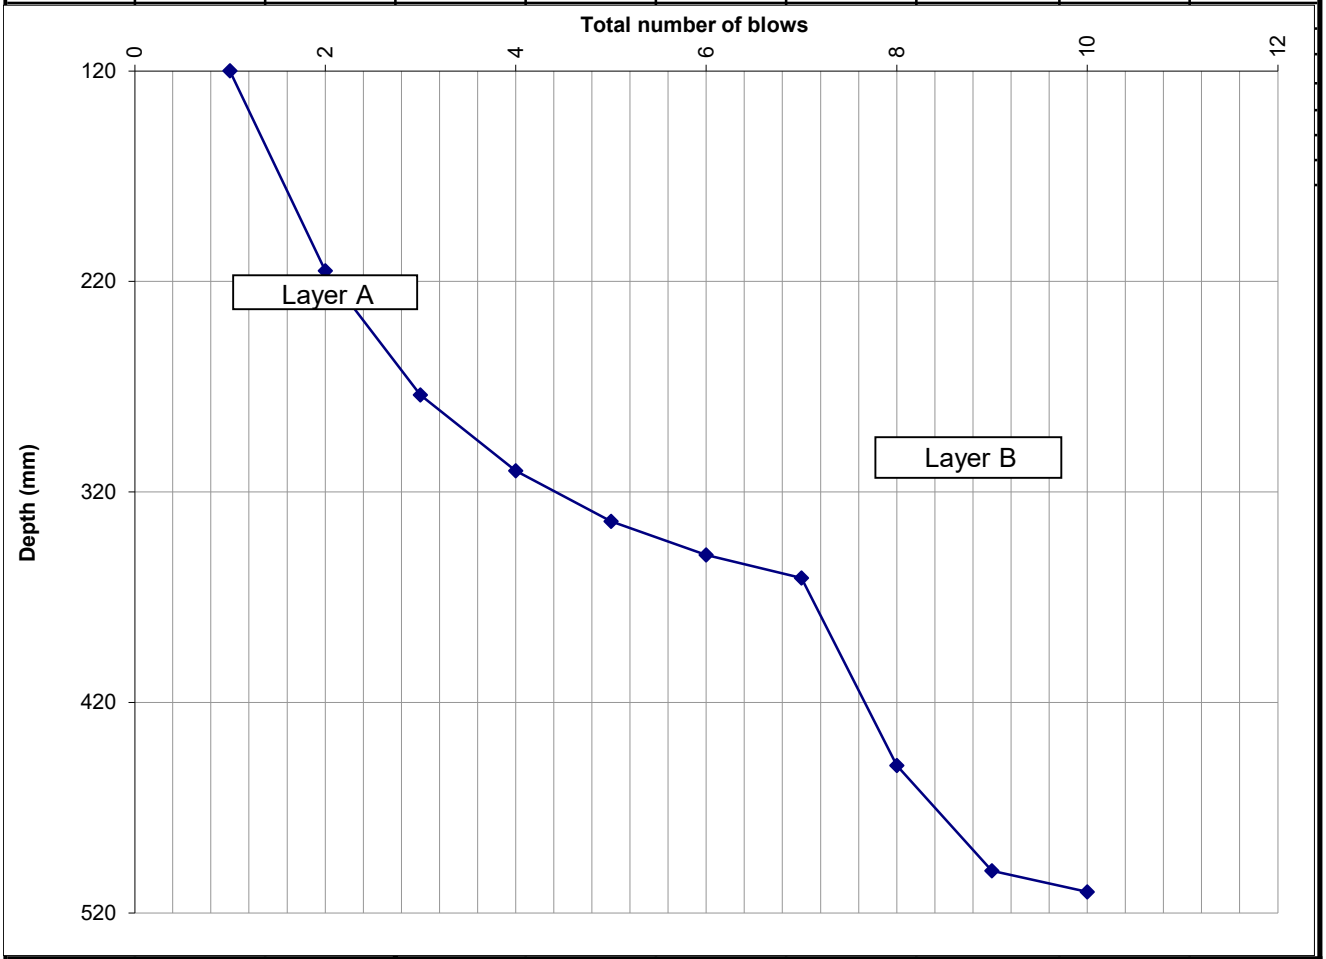

	Start depth BGL					
Checked : *R.Griffiths*	17/09/2019					
		Weather	Sunny	Operators	KJG	
